

平成29年度

総務産業常任委員会

所管事務調査資料


「公共土木施設災害復旧工事の進捗状況」

建設課

公共土木施設災害復旧工事発注調書

No.	発注名	予算区分	契約金額	請負業者	工期	入札月日	契約月日	完了月日	検査月日	備考
1	清水基線道路 災害復旧工事	H28	10,454,400	清水開発工業(株)	H28.11.22 H29.02.10	H28.11.17	H28.11.22	H29.01.10	H29.01.10	
2	羽帯17号道路② 災害復旧工事	H28	7,689,600	清水開発工業(株)	H28.11.29 H29.02.10	H28.11.24	H28.11.29	H29.02.10	H29.02.23	
3	剣山里宮間道路 災害復旧工事	H28	13,208,400	御影建設工業(株)	H28.11.25 H29.02.20	H28.11.24	H28.11.25	H29.02.20	H29.02.22	
4	新羽帯常盤間道路 災害復旧工事	H28	11,836,800	(株)サカキ建設工業	H28.11.29 H29.02.10	H28.11.24	H28.11.29	H29.01.25	H29.01.25	
5	西清水2号道路 災害復旧工事	H28	2,592,000	クリアロード(株)	H28.11.25 H29.01.20	H28.11.24	H28.11.25	H29.01.20	H29.01.26	
6	小林川 災害復旧工事	H28	12,852,000	(株)サカキ建設工業	H28.11.29 H29.03.01	H28.11.24	H28.11.29	H29.02.24	H29.03.08	
7	上小林川 災害復旧工事	H28	18,748,800	田村建設(株)	H28.11.25 H29.03.10	H28.11.24	H28.11.25	H29.03.02	H29.03.08	
8	久山川 災害復旧工事	H28	44,874,000	河井ローダー建設(株)清水支店	H28.11.25 H29.03.17	H28.11.24	H28.11.25	H29.03.06	H29.03.08	
	H28合計		122,256,000							
9	羽帯南9線道路 災害復旧工事	H28繰越	4,568,400	北洋道路(株)清水支店	H29.03.17 H29.07.20	H29.03.16	H29.03.17	H29.07.10	H29.07.19	
10	側道上清水3・4号道路 災害復旧工事	H28繰越	29,851,200	御影建設工業(株)	H29.03.17 H29.10.02	H29.03.16	H29.03.17	H29.10.02	H29.10.12	
11	上熊牛橋内間道路 災害復旧工事	H28繰越	1,944,000	クリアロード(株)	H29.03.17 H29.06.30	H29.03.16	H29.03.17	H29.06.01	H29.06.14	
12	美蔓16号環状線道路 災害復旧工事	H28繰越	4,406,400	北洋道路(株)清水支店	H29.03.17 H29.07.20	H29.03.16	H29.03.17	H29.07.10	H29.07.19	
13	羽帯17号道路 災害復旧工事	H28繰越	6,825,600	紺野建設(株)	H29.03.21 H29.07.31	H29.03.16	H29.03.21	H29.07.31	H29.08.09	
14	石山7号道路外 災害復旧工事	H28繰越	9,288,000	クリアロード(株)	H29.03.17 H29.08.10	H29.03.16	H29.03.17	H29.07.31	H29.08.08	
15	旭山上羽帯間道路 災害復旧工事	H28繰越	83,916,000	田村建設(株)	H29.03.21 H29.12.20	H29.03.16	H29.03.21			
16	旭山南14線道路 災害復旧工事	H28繰越	15,746,400	クリアロード(株)	H29.03.17 H29.08.30	H29.03.16	H29.03.17	H29.07.31	H29.08.08	
17	里宮道路 災害復旧工事	H28繰越	30,488,400	(株)サカキ建設工業	H29.03.22 H29.09.29	H29.03.16	H29.03.22	H29.09.29	H29.10.12	
18	日進昭和間道路 災害復旧工事	H28繰越	2,916,000	北洋道路(株)清水支店	H29.03.17 H29.07.10	H29.03.16	H29.03.17	H29.07.10	H29.07.19	
19	旭山10号道路 災害復旧工事	H28繰越	24,192,000	(株)池戸土建	H29.03.21 H29.09.20	H29.03.16	H29.03.21	H29.06.30	H29.07.11	
20	円山幹線道路(牧場橋) 災害復旧工事	H28繰越	51,321,600	河井ローダー建設(株)清水支店	H29.03.22 H29.10.20	H29.03.16	H29.03.22	H29.10.06	H29.10.12	
	H28繰越合計		265,464,000							
21	東郷愛昭和間道路 災害復旧工事	H29	57,780,000	(株)サカキ建設工業	H29.08.27 H30.02.20	H29.05.18	H29.06.27			
22	清水基線道路 災害復旧工事	H29	3,099,600	クリアロード(株)	H29.05.12 H29.09.11	H29.05.11	H29.05.12	H29.06.01	H29.06.14	
23	清水第3線道路 災害復旧工事	H29	14,072,400	田村建設(株)	H29.06.26 H29.10.30	H29.06.23	H29.06.26	H29.10.16	H29.10.27	
24	清水御影間道路 災害復旧工事	H29	22,734,000	(株)シムズ建設工業	H29.06.27 H29.10.30	H29.06.23	H29.06.27	H29.10.30	H29.11.10	
25	中央東郷愛間道路 災害復旧工事	H29	17,820,000	(株)池戸土建	H29.06.26 H29.10.30	H29.06.23	H29.06.26	H29.10.06	H29.10.12	
26	旭山12線道路 災害復旧工事	H29	2,646,000	笹川組工業(株)	H29.09.15 H29.12.20	H29.09.14	H29.09.15			
27	御影12号道路(平和橋) 災害復旧工事	H29	197,575,200	田村建設(株)	H29.08.24 H30.03.23	H29.08.17	H29.08.24			
	H29合計		315,727,200							
	総合計		703,447,200							

公共土木施設災害復旧箇所位置図

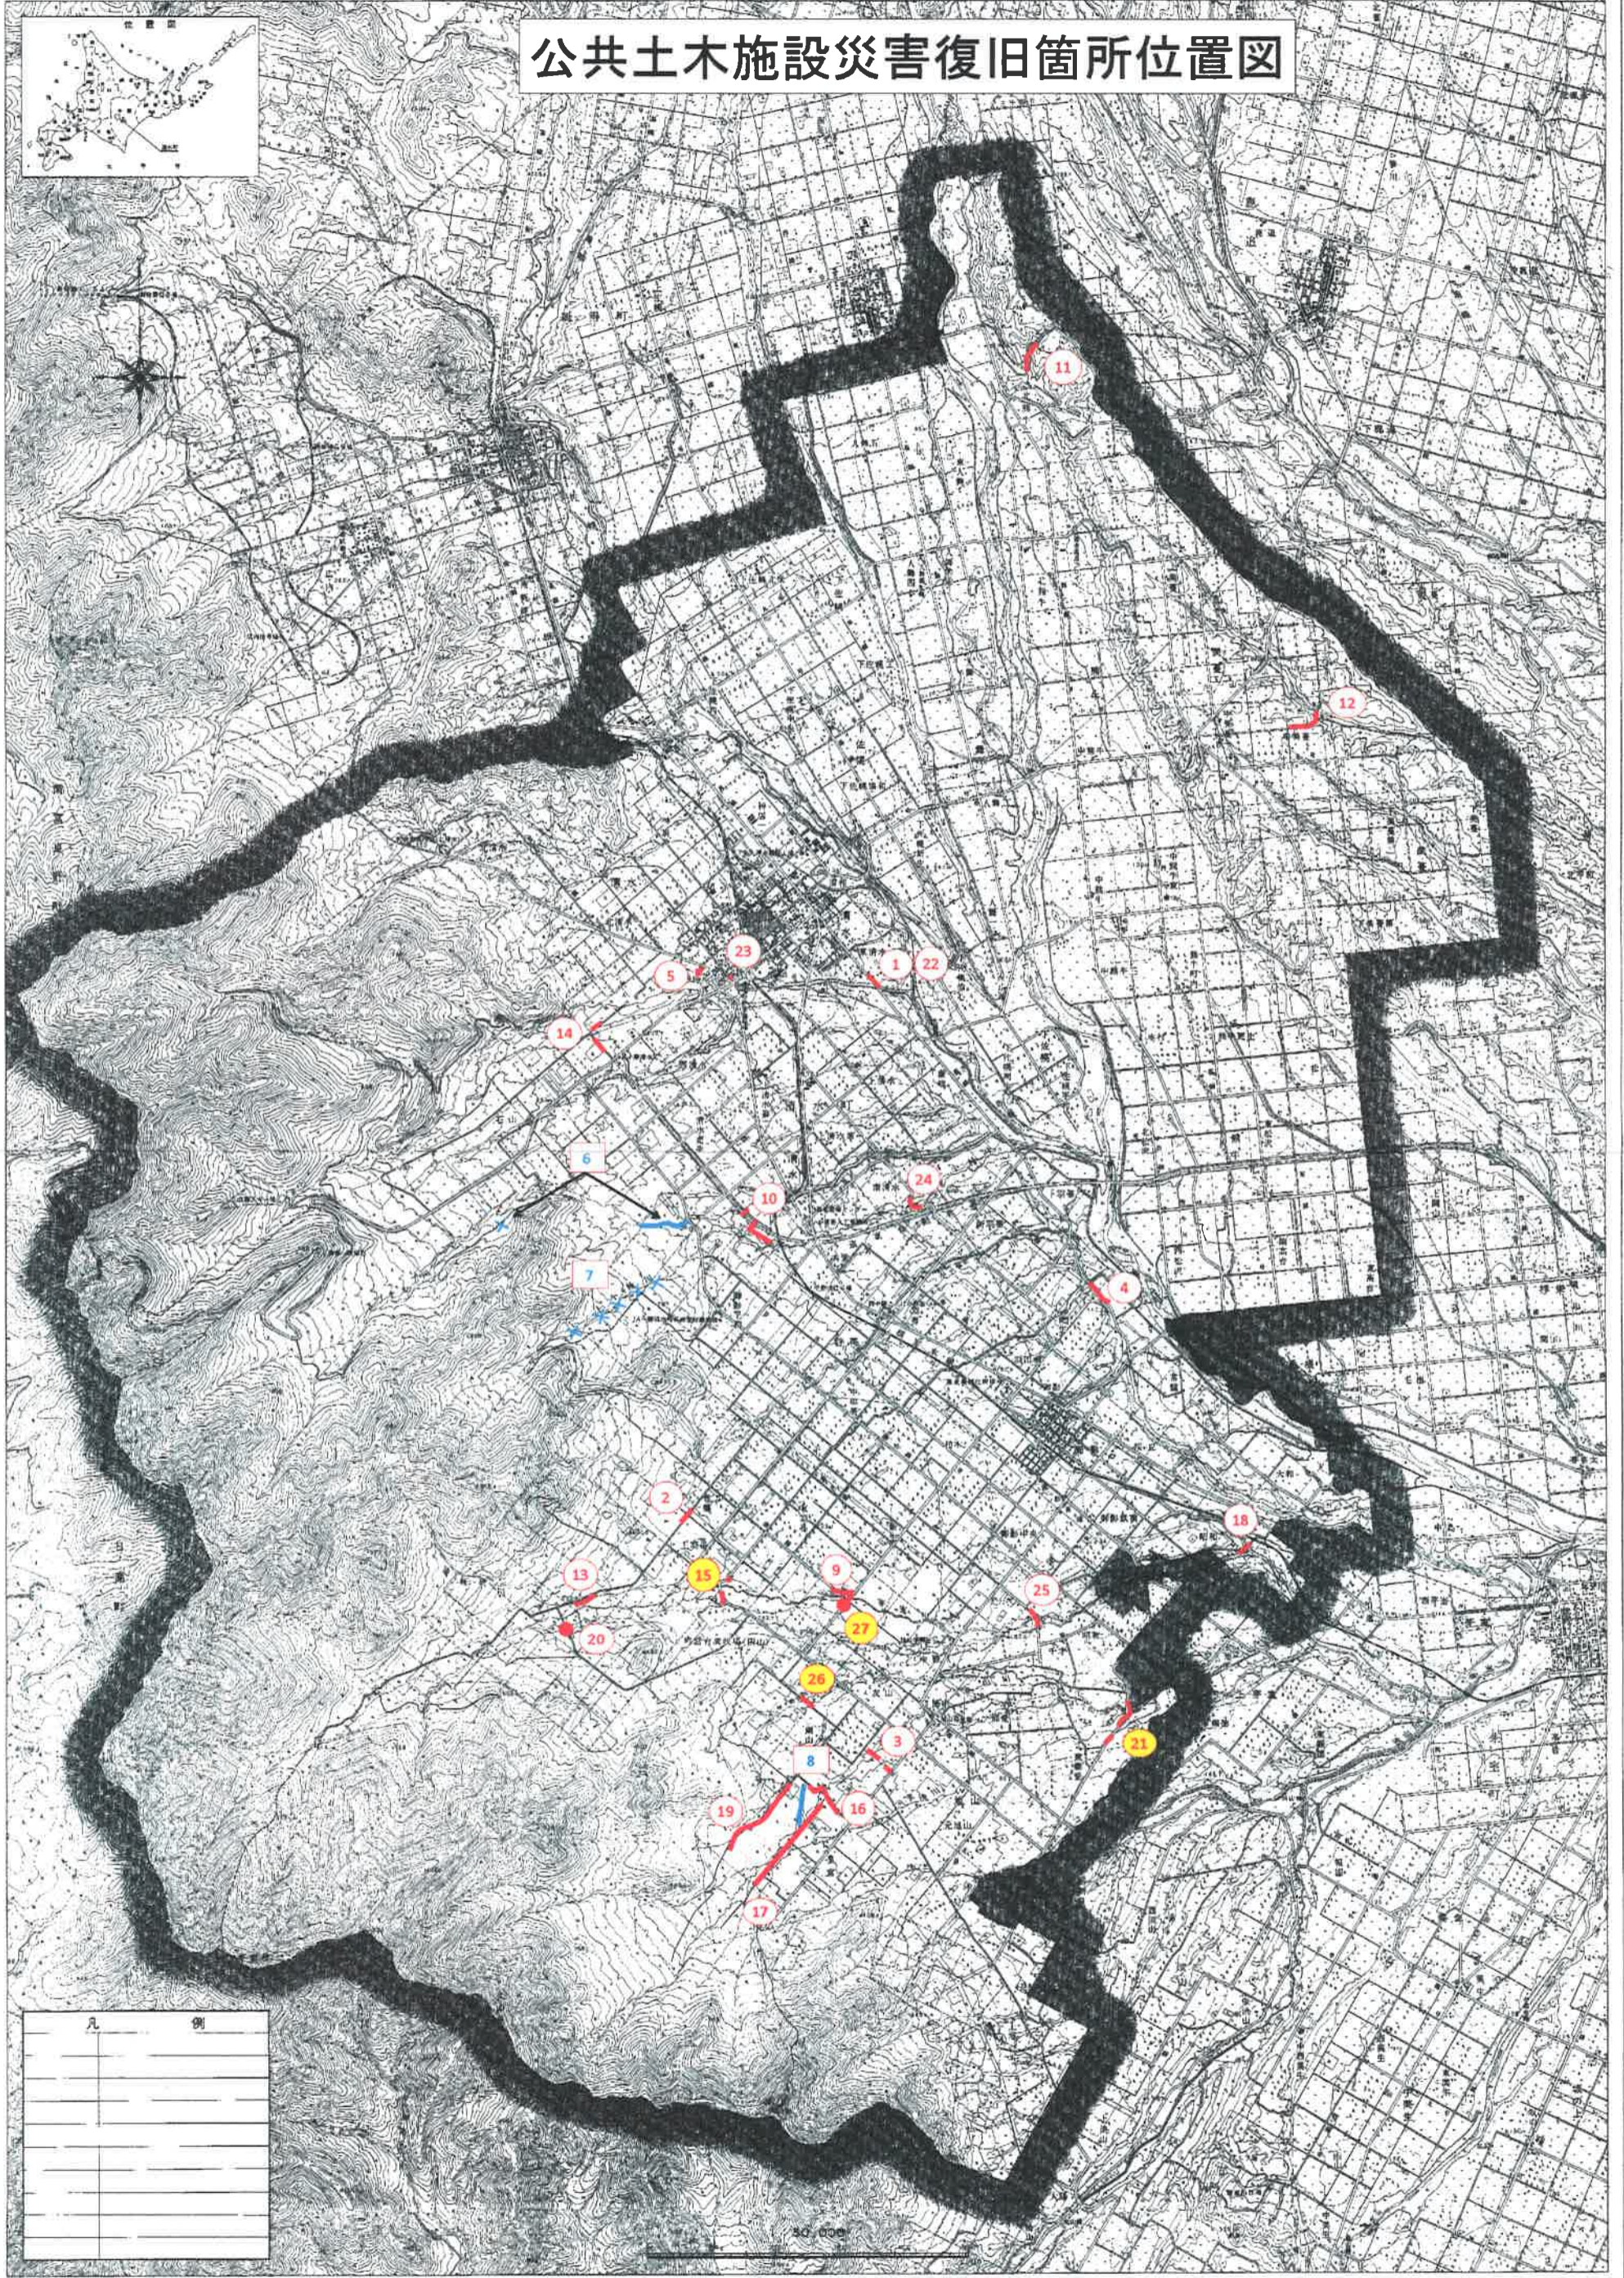

凡 例	

TEC-FORCE

被災状況調査様式

(道 路)




Technical
Emergency
Control -
FORCE

TEC-FORCE : 緊急災害対策派遣隊

平成28年9月15日

北海道開発局 (網走・道路班)

御影・旭山地区 被災状況調査 (道路・橋梁)

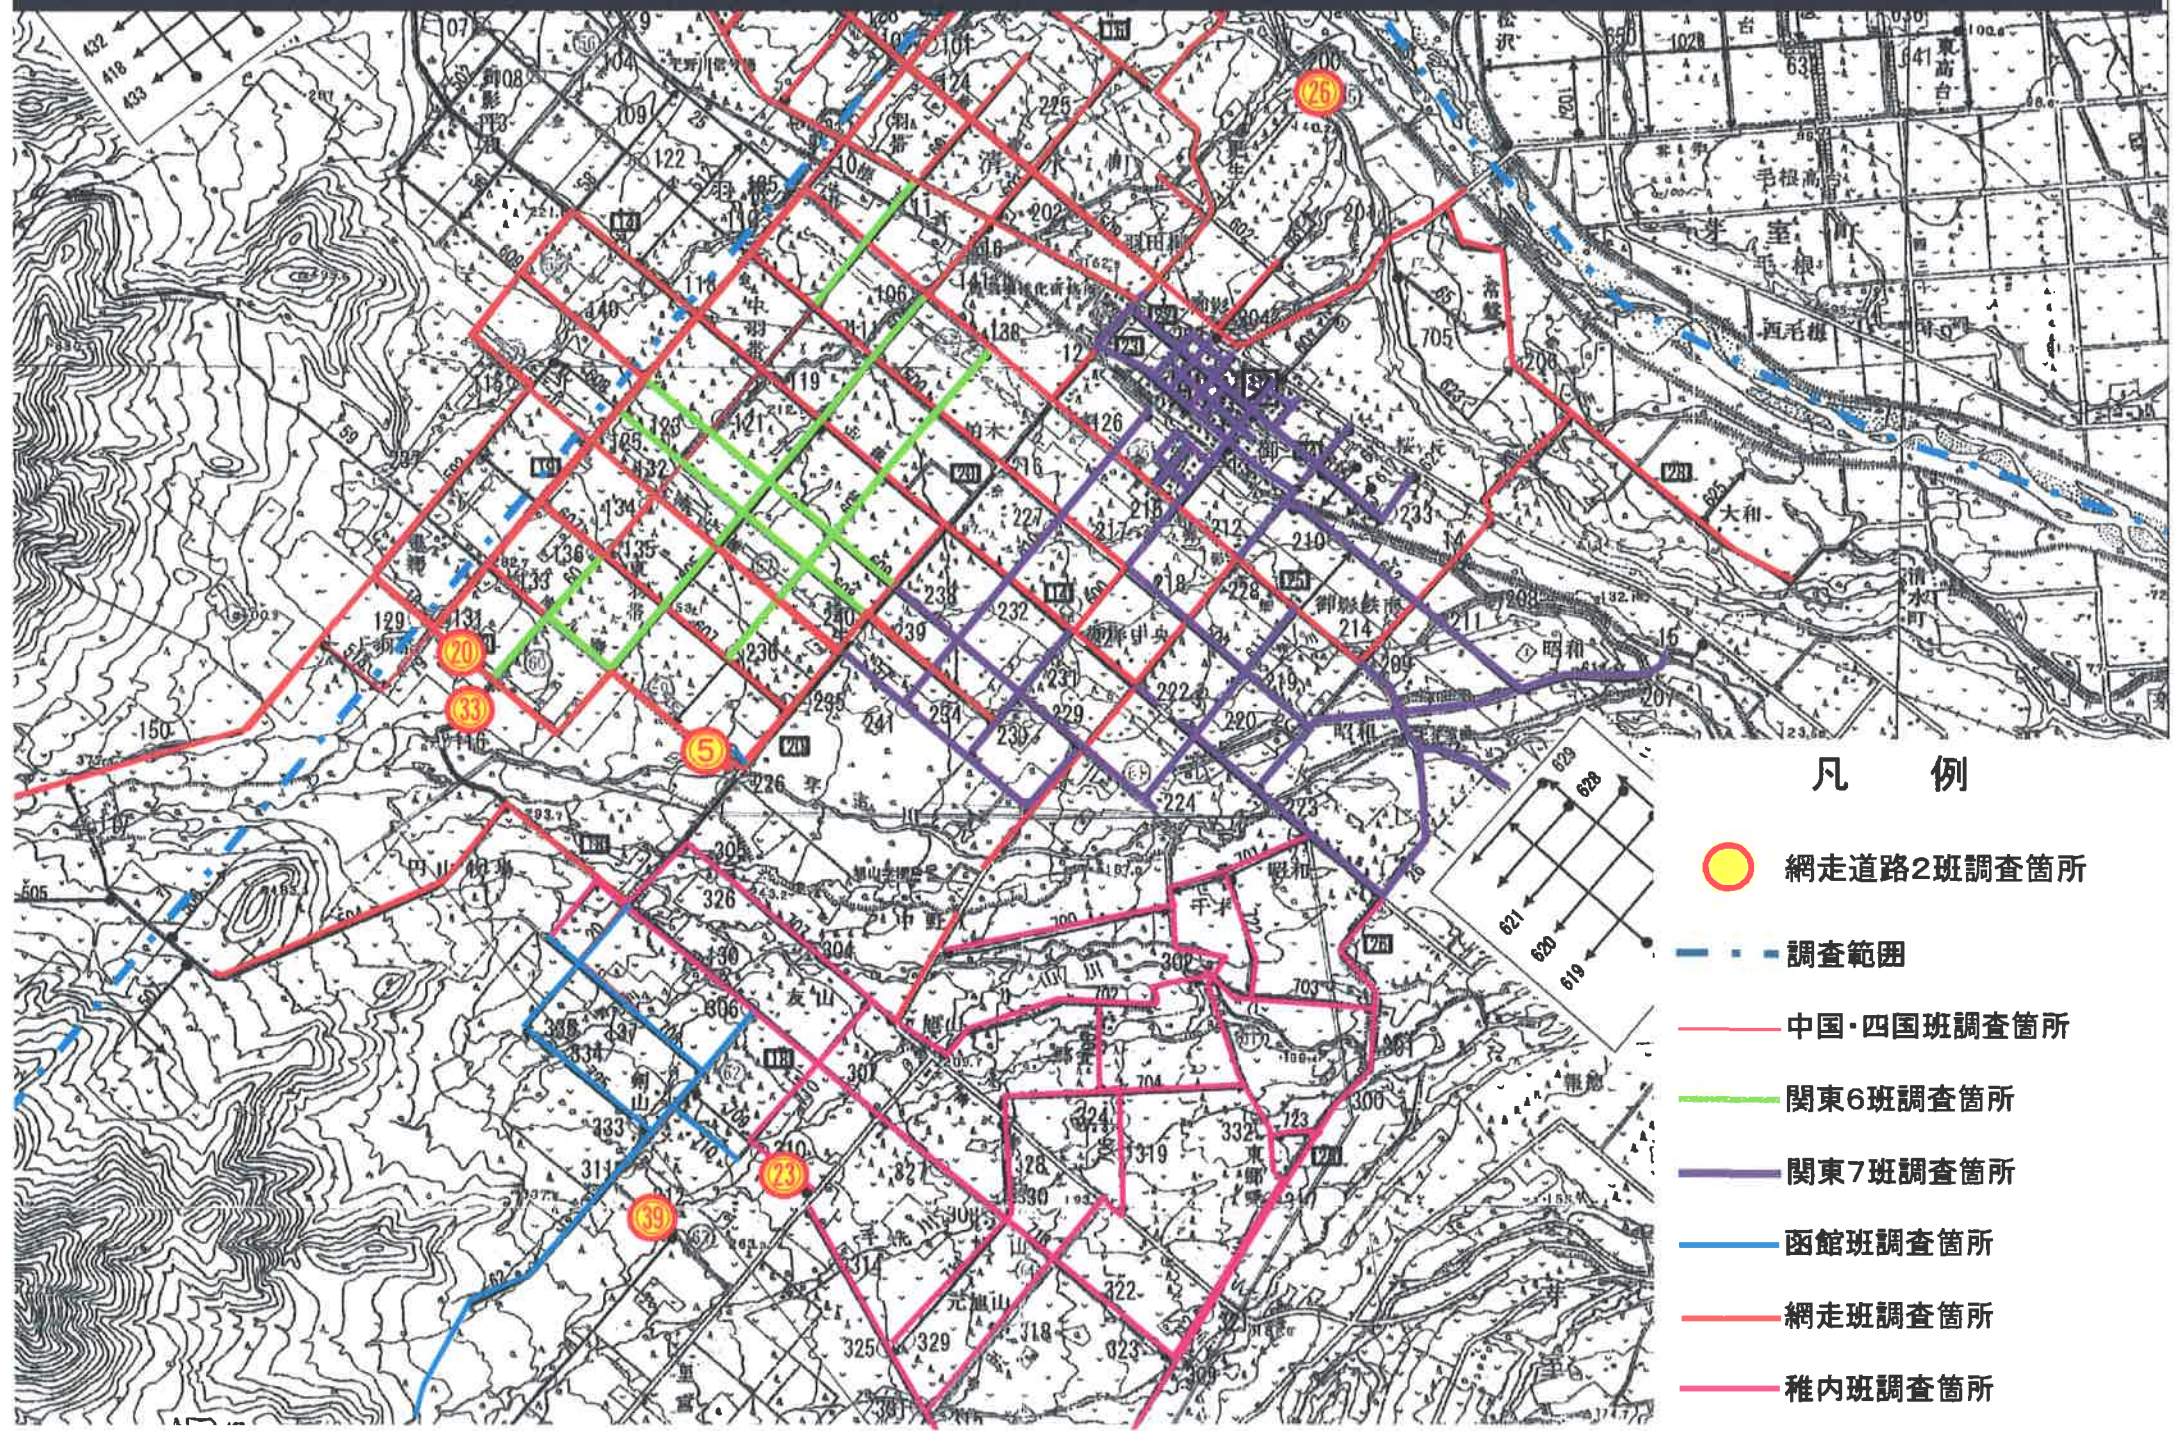


【様式-3】調査表①

北海道開発局 網走2班


箇所番号	33	調査日時	9月12日 10:45時点	災害種別	道路
調査箇所	河川・路線名等		1級路線旭山上羽帯間道路		
	地先等		上羽帯		
被災施設(代表施設) 被災規模(延長・高さ等)		道路崩壊 L=80m			被災原因
被害状況	一般被害	交通規制	応急対応	その他	河川の氾濫
	田畑	通行止	必要	—	

被災概況(スケッチ)

▼平面スケッチ

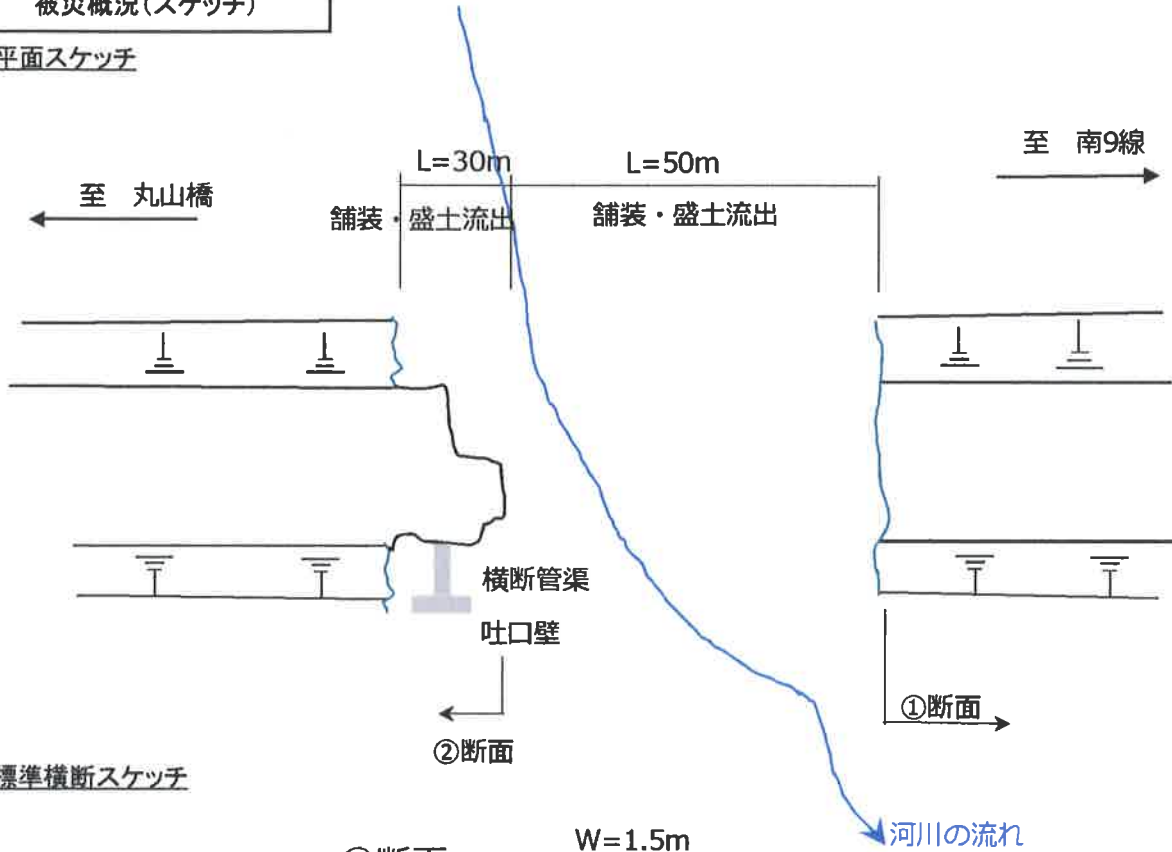

▼標準横断スケッチ

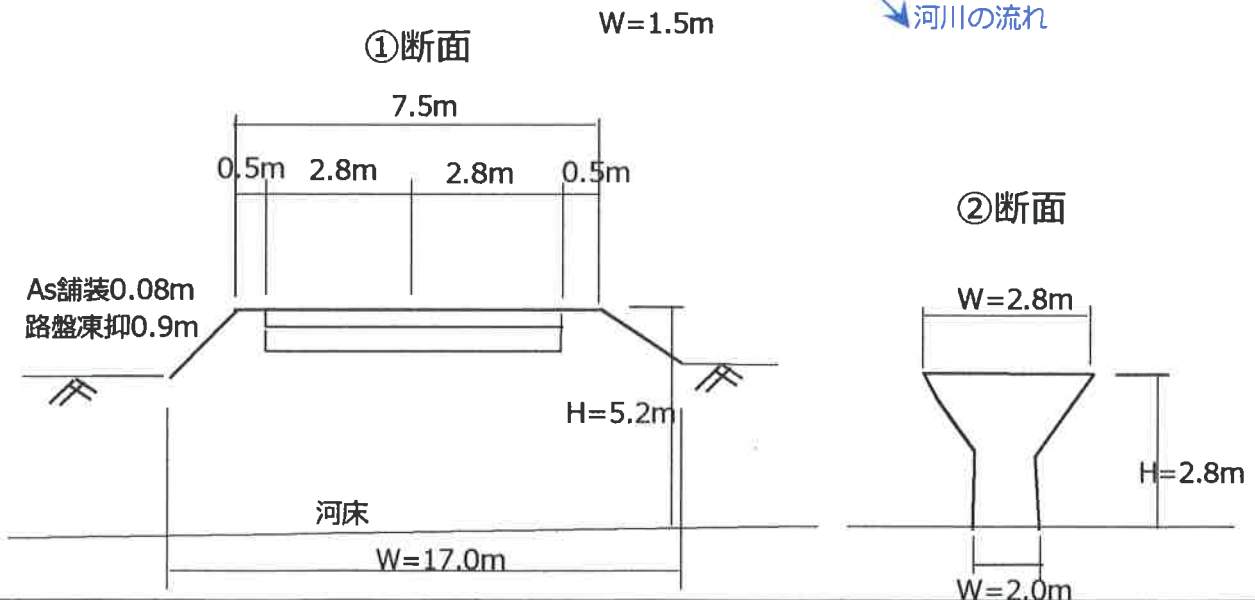

概算被害額

28百万円

【様式-4】調査表②

北海道開発局 網走2班

箇所番号	33	調査日時	9月12日 10:45時点	災害種別	道路
					
<p><コメント> ・ 起点側より</p>		<p><コメント> ・ 終点側より</p>			
					
<p><コメント> ・ 起点側崩壊状況</p>		<p><コメント> ・ 終点側崩壊状況</p>			
<p>技術的所見</p>					
<p>・ 河川の氾濫により路体が流出した。現況復旧に加えて、流水が継続するようであれば、横断排水が必要。</p>					
